

Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West: Aktueller Stand des Projekts

Medienkonferenz vom 23. Juni 2009



Referenten

- **Reto Nause**, Gemeinderat
Direktor für Sicherheit, Umwelt und Energie
- **Stefan Dellenbach**,
Leiter Bauprojektmanagement, Stadtbauten Bern
- **Rudolf Lanzrein**, CEO Stadtbauten Bern
- **Franz Bachmann**, Kommandant Berufsfeuerwehr Bern

Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West

Ausgangslage des Projekts

- Forsthaus West: ein idealer Standort
- Versorgungssicherheit auf ganzem Stadtgebiet gewährleistet
- Nähe zur KVA ermöglicht wirtschaftliche und betriebliche Synergien
- Heutige Wohngebiete in der Stadt werden entlastet
- Grundlage: Abstimmung über den Zonenplan Forsthaus West vom 24. Februar 2008

Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West

Aktueller Stand des Projekts

- Planungsphase ist abgeschlossen
- Baubewilligung wurde erteilt
- Projekt steht vor der Umsetzung
- Erste Grobkostenschätzung: 35 Mio. Franken
- Aktuelles Kostenvolumen: 53,9 Mio. Franken
- Lenkungsausschuss hat Massnahmen eingeleitet

Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West

Mitglieder Lenkungsausschuss

- **Reto Nause**, Direktor für Sicherheit, Umwelt und Energie
(Vorsitz, seit 1.1.2009)
- **Stefan Dellenbach**,
Leiter Bauprojektmanagement, Stadtbauten Bern
- **Andreas Mathez**, Bauprojektmanagement, Stadtbauten Bern
- **Franz Bachmann**, Kommandant Berufsfeuerwehr Stadt Bern

Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West

Kostenentwicklung

- Höhere betriebliche Anforderungen: **+ 7 Mio.**
- Erhöhter Flächenbedarf für Zentralisierung FZQ: **+ 2 Mio.**
- Zusätzliche Kosten bei Erschliessung des Baugrundstücks: **+ 3 Mio.**
- Aufgelaufene Teuerung (gemäss Preisindex Hochbau): **+ 5 Mio.**

	Total	52 Mio.
	Reserve	+1,9 Mio.

- **Kostendach (Juni 2009): 53,9 Mio. Franken**

(Alle Beträge gerundet)

Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West

Optimiertes, modernes Projekt

- Projekt erfüllt höchste Anforderungen bezüglich Landschaftsschutz
- Im Bereich Energie geht der Bau über die gesetzlichen Anforderungen hinaus (Minergie-Eco-Standard)
- Insgesamt ein betrieblich wegweisender, moderner Feuerwehrstützpunkt an optimaler Lage




Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West

Weiteres Vorgehen

- Antrag Baukredit (VR StaBe, GR, SR) bis Ende 2009
- Ausschreibung, Vergabe und Baubeginn 2010
- Bauende und Inbetriebnahme 2013



Einsatzgebiet Berufsfeuerwehr Stadt Bern

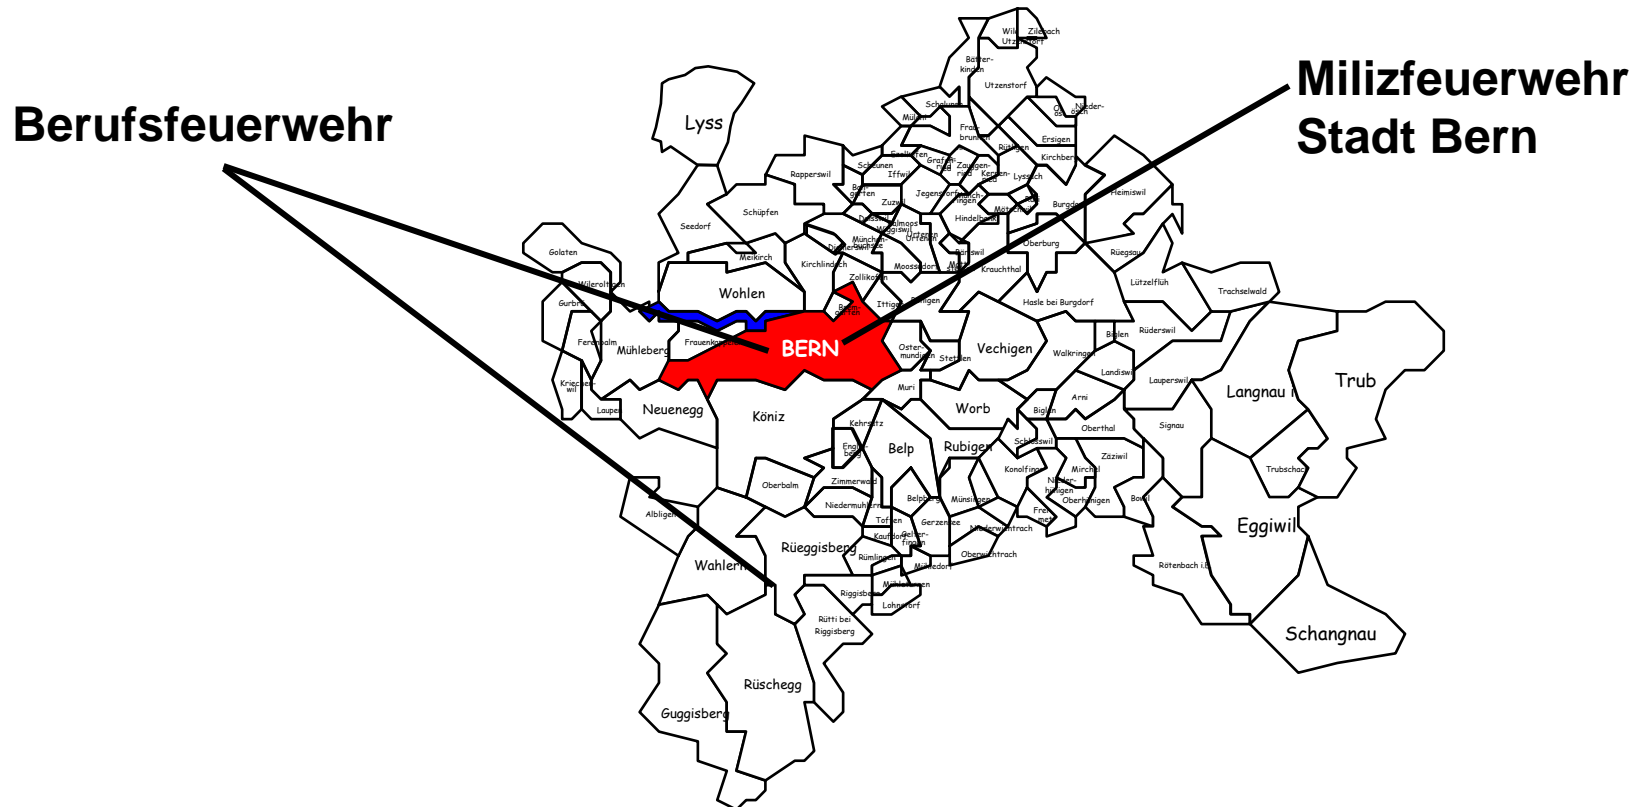

Ausdehnung des Einsatzgebietes
Schutzmitverantwortung für

1' 550 Quadratkilometer
500'000 Einwohnerinnen / Einwohner

Hochspezialisierter Dienstleistungsbetrieb

Breites Spezialwissen



**Grosse Einsatz- und
Rettungsmaterialpalette**



Leistungsvorgaben Brand




**H + 10 Minuten im dicht besiedelten Gebiet
Ersteinsatzelement auf dem Schadenplatz einsatzbereit**



**H + 15 Minuten im dünn besiedelten Gebiet
Ersteinsatzelement auf dem Schadenplatz einsatzbereit**

Standorte der Abteilung Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt

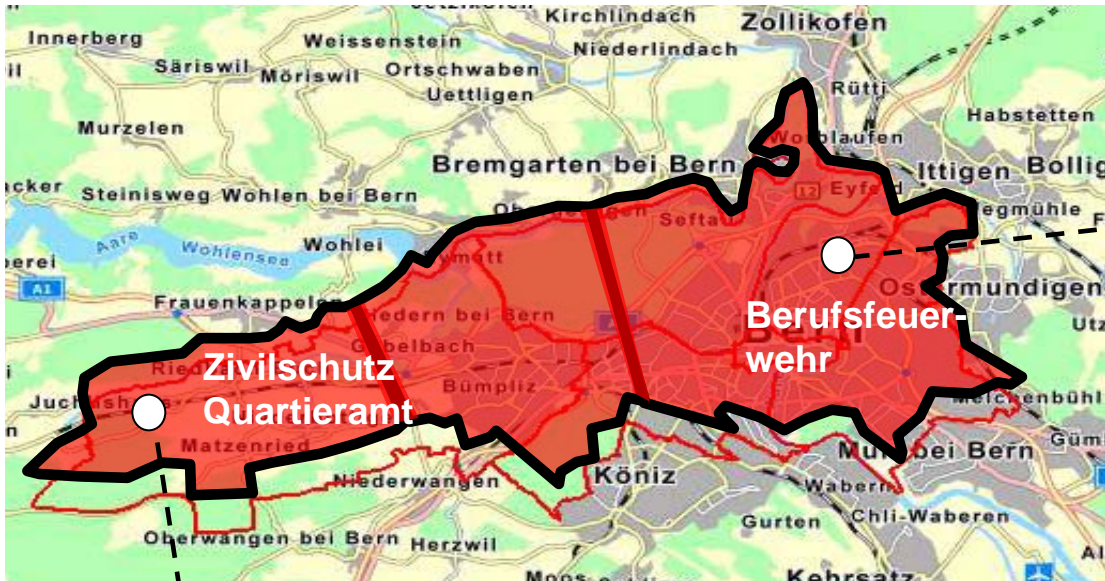

Viktoriastrasse



Riedbach

Der Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West...

Anforderungen an den Feuerwehrstützpunkt


- Der neue Feuerwehrstützpunkt ist sowohl Einsatzkaserne als auch Ausbildungsplattform, Werk-, Dienstbetriebs-, Unterkunfts- und Lagerstätte.
- Der neue Feuerwehrstützpunkt ist eine dauernd belegte Anlage mit höchstem Bereitschaftsgrad. Dies verlangt:
 - Optimale funktionale Vernetzung aller Betriebseinheiten untereinander
 - Kürzest mögliche Wegführung für schlanken und raschen „120-Sekunden-Ausfahreinsatz“

Der Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West...

Anforderungen an den Feuerwehrstützpunkt

- Der neue Feuerwehrstützpunkt ist die Basis für die räumliche Zusammenführung der Bereiche Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt
- Der neue Feuerwehrstützpunkt muss am idealen Standort sein, einerseits zentral um alle Stadtteile vorgabekonform zu erreichen, andererseits um die Region, die Autobahn und das Eisenbahnnetz schnell erreichen zu können

Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West

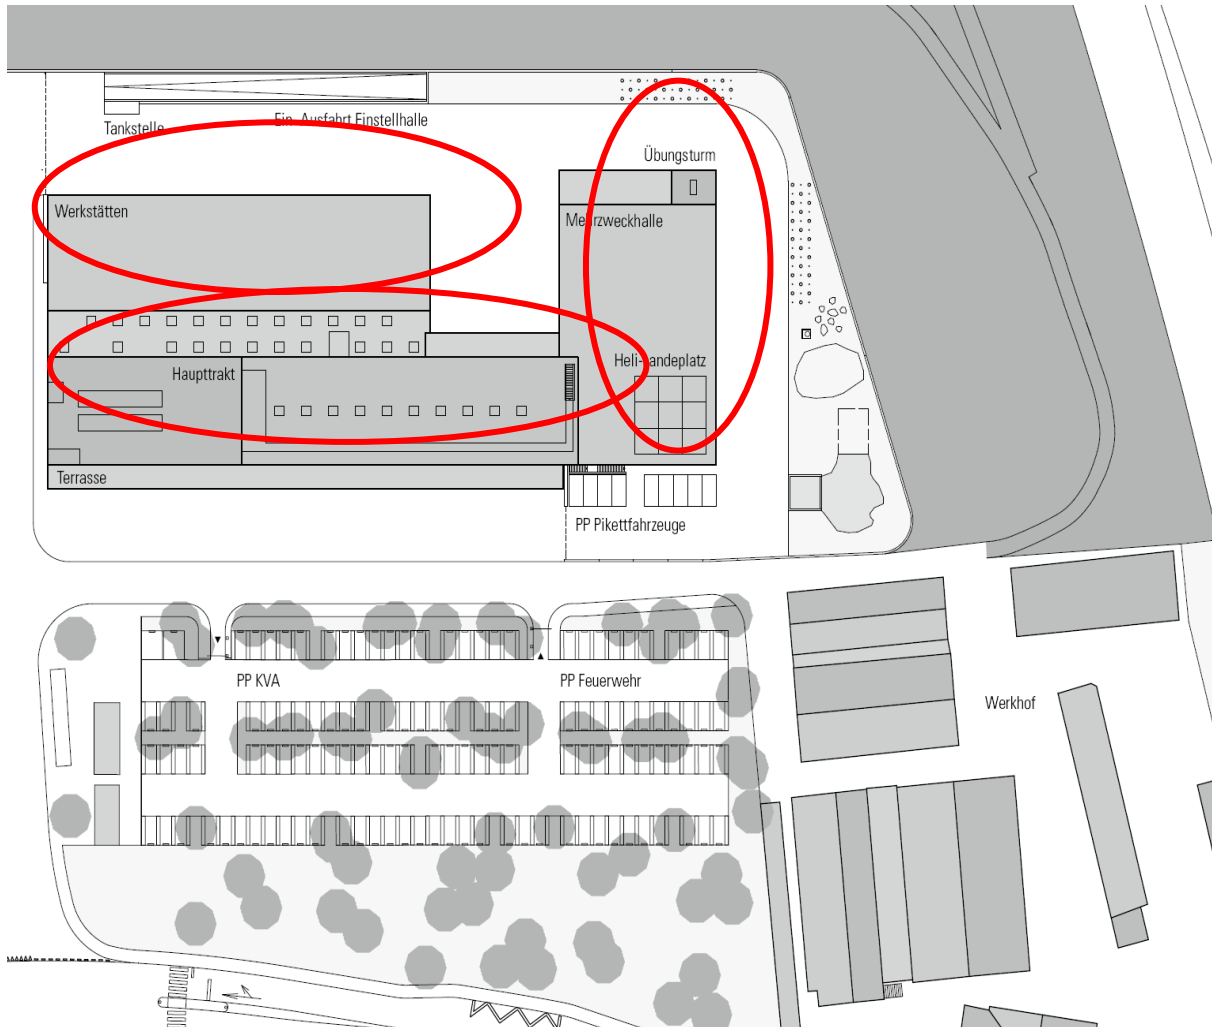

Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West; Haupttrakt



Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West; Werkstatttrakt



Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West; Mehrzweckhalle und Übungsturm



Der Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West...

Auswirkungen allfälliger Projektverzögerungen

- Die Feuerwehrversorgung im Westen von Bern kann weiterhin nicht innerhalb der Vorgabezeiten gewährleistet werden. Die Risiken steigen.
- Die Umsetzung von effizienten Prozessabläufen im Feuerwehreinsatz wird behindert, was sich sowohl in der Stadt als auch in der Region negativ auswirkt.
- Die räumliche Zentralisierung der Abteilung Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt wird hinausgeschoben. Die rasche Realisierung von abteilungsinternen Synergiegewinnen wird nicht möglich.

Der Feuerwehrstützpunkt Forsthaus West...

- ... entspricht den Anforderungen einer auf heutige Gefahren und Risiken ausgerichteten, modernen Feuerwehr**
- ... erfüllt höchste Ansprüche im Bereich des Umwelt- und Landschaftsschutzes sowie der Nachhaltigkeit**
- ... ist ein Projekt mit langfristiger Perspektive**
- ... ist eine Investition in die Zukunft und in die Sicherheit der Bevölkerung von Bern und den umliegenden Gemeinden**
